PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Work Instruction

PPL-W-03

PEMBUATAN ASSY PLAN

APPROVED	CHECKED	PREPARED
DEDI KURNIAWAN P / PPC JMGR	EVANINGSIH M / PPC SSPV	AVIF PRIMA N / PPC SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN ASSY PLAN

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pembuatan Assy Plan sebagai rencana produksi yang digunakan untuk memproduksi wiring harness.

WHEN Instruksi ini diterapkan untuk membuat Assy Plan setiap menerima SR dari customer (Internal Yazaki / YNAN).

WHERE Instruksi ini diterapkan di PT JAI untuk semua produk.

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen PPIC Seksi PPC.

WHY Untuk membuat rencana produksi selama satu bulan ke depan ke dalam bentuk harian (W/P = Working Periode) atas semua harness yang memiliki order pada bulan tersebut.


II. ISTILAH

1	SR	:	Shipping Release yaitu Purchase Order dari customer yang menyatakan assy number, jumlah dan waktu yang di butuhkan oleh customer.
2	SPP	:	Six months Production Plan Rencana produksi jangka pendek untuk 6 bulan ke depan yang di buat berdasarkan order customer dan forecasting untuk kebutuhan perencanaan material. Mesin, equipment, dll.
3	Assy Plan	:	Rencana produksi harian untuk jangka waktu 1 bulan yang menyatakan assy number dan jumlah produksi sebagai pedoman di area produksi untuk melakukan proses.
4	Shipment Schedule Tracking	:	Report yang berisikan tentang order dari customer, rencana produksi dan hasil pengiriman.
5	Customer	:	Yazaki sales affiliate.

PEMBUATAN ASSY PLAN

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOW CHART

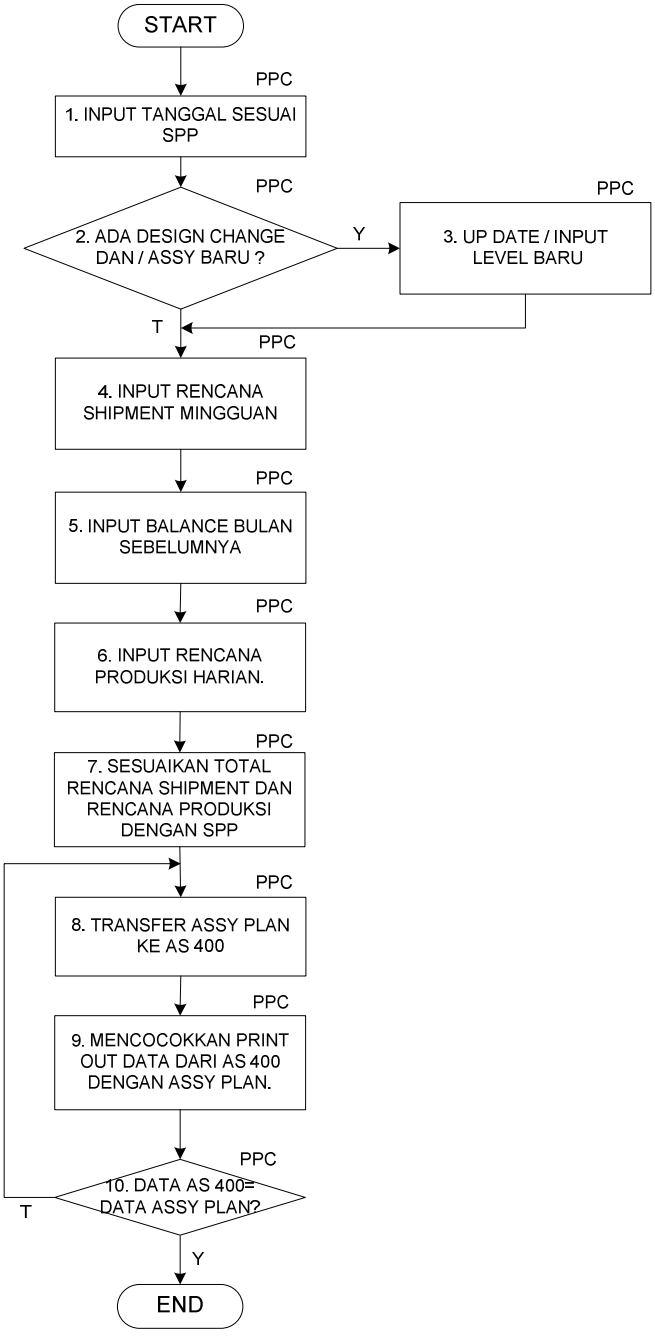

IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PPC	Input tanggal sesuai SPP	Melakukan input tanggal untuk Final Assy serta memasukkan data jumlah harness yang akan diproduksi pada bulan berjalan sesuai SPP.
2	PPC	Ada design change dan / assy baru?	Apakah ada design change dan / assy baru ? Jika ya lanjutkan ke nomor 3, jika tidak ke nomor 4
3	PPC	Update / input level baru	Jika ada design change dan / assy baru maka up date / input level baru tersebut, kemudian proses dilanjutkan ke proses no 4
4	PPC	Input rencana Shipment mingguan	Lakukan input quatity rencana shipment mingguan yang diambil dari SR.
5	PPC	Input balance bulan sebelumnya	Input balance dari data bulan sebelumnya berdasarkan over ataupun delay yang akan dikerjakan pada bulan itu.
6	PPC	Input rencana produksi harian	PPC memasukkan rencana produksi harian yang dibuat berdasarkan data balance bulan sebelumnya, rencana shipment mingguan dan kapasitas produksi
7	PPC	Sesuaikan total rencana shipment dan rencana produksi dengan SPP	PPC menyesuaikan total rencana jumlah shipment dan rencana produksi pada akhir bulan dengan SPP
8	PPC	Transfer Assy plan ke AS-400	PPC melakukan transfer assy plan yang telah di approve ke program AS-400. Input assy plan ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan material setiap hari
9	PPC	Mencocokkan print out data dari AS-400 dengan assy plan	PPC mencocokkan data print out AS-400 dengan data assy plan
10	PPC	Data AS-400 = data Assy plan?	Apakah data AS-400 sama dengan data Assy plan ? Jika ya, maka proses berakhir, jika tidak kembali ke no.8.

KETERANGAN

1. Nomor perubahan SR ditambahkan pada bagaian bawah dari halaman depan Assy Plan yang direvisi.
2. Tuliskan bulan, minggu, dan revise sesuai dengan pemakaian assy plan pada bagian atas

V. REFERENCES

- Prosedur "Production Plan"
- Instruksi "Pembuatan SPP (Six Months Production Planning)
- Instruksi " Shipping Release Review "

VI. DOKUMEN KONTROL

- Assy plan

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatn Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/ TS 16949 ini dimulai dari nol	19 Feb 2004	QSA
02	- Penghilangan Exim sebagai penganggungjawab pada BAB I - Penghilangan kolom Record, karena masa penyimpanan record dapat dilihat pada Daftar Induk Quality Record	31 Jan 2007	PPC
03	- Revisi flowchart ítem no.3 yaitu : up date / input UMH, Level, Jml circuit ,assy code menjadi up date / input level baru	09 Juli 2013	PPC
04	- Revisi flowchart no.8 yaitu input assy plan di AS 400 menjadi transfer assy plan ke AS	14 Aug 2025	PPC
