PQP-W-17

PRODUCTION PREPARATION COST CONTROL

APPROVED	CHECKED	PREPARED
TEGUH W. / PP MANAGER	TEGUH W. / PP MANAGER	LITA D / PP SSPV

Versi Indonesia

PRODUCTION PREPARATION COST CONTROL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Instruksi ini digunakan untuk mengontrol production preparation cost yang berhubungan dengan man, method, machine dan material dari semua departemen yang berhubungan dengan aktivitas expense production preparation

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat fase preparation hingga SOP mengacu pada prosedur Product Realization

WHERE Instruksi ini digunakan untuk semua carline di PT. JAI

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah departemen PP yang disupport oleh departemen terkait

II. FLOW CHART PEMBUATAN REPORT PP COST MOTHLY

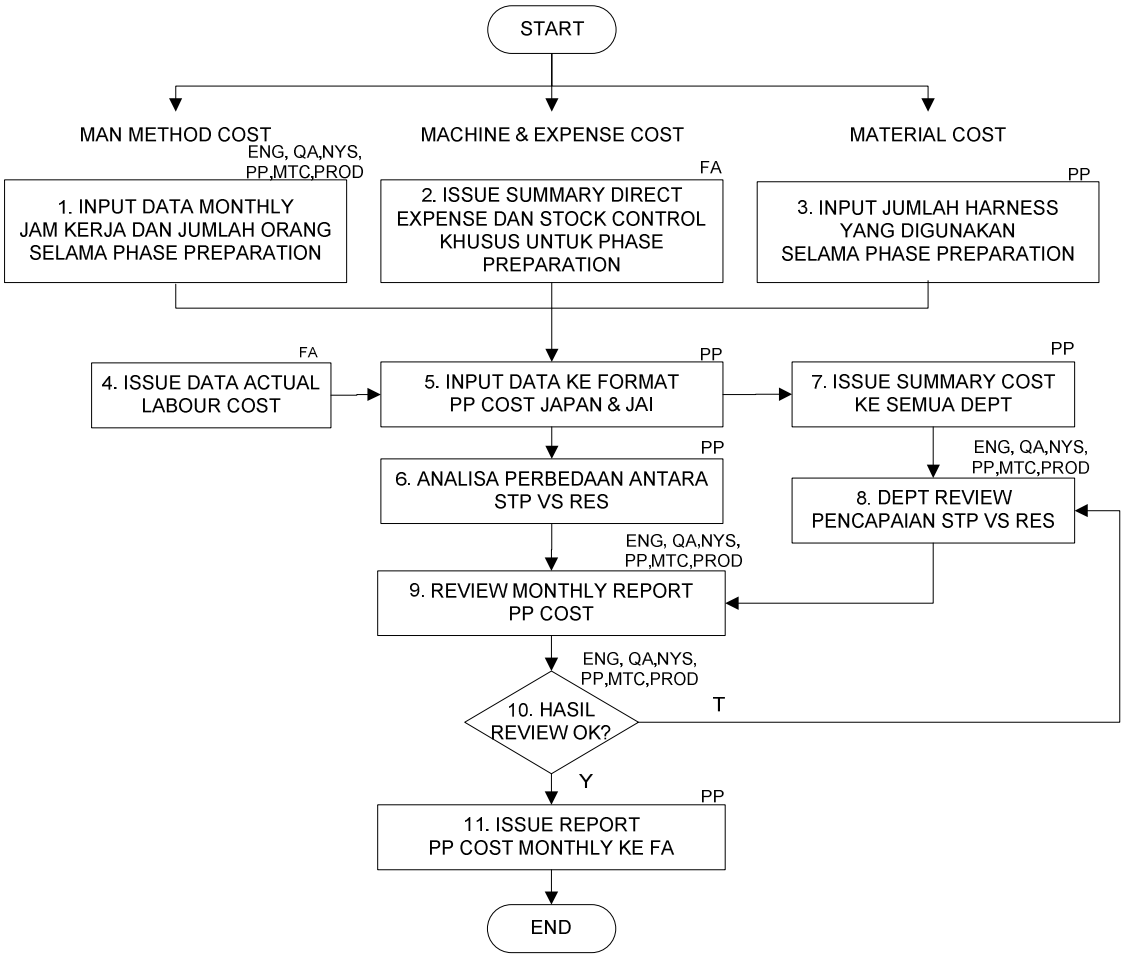

III. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
1	MTC,ENG, QA,NYS, PP,PROD	Input data monthly jam kerja dan jumlah orang selama phase preparation	Melakukan input data monthly jam kerja & jumlah orang ke dalam check sheet man hour di data sharing KAWI sesuai dengan aktivitas preparation yang ada dibulan berjalan dan disesuaikan dengan plan yang sudah dibuat	Max hari kerja ke 3
2	FA	Issue summary direct expense dan stock control khusus untuk phase preparation	Issue summary direct expense sesuai delivery timing dan quantity part sesuai stock control untuk part yang digunakan saat preparation	Max hari kerja ke 4
3	PP	Input jumlah harness yang digunakan selama phase preparation	Melakukan input jumlah harness yang digunakan untuk training maupun HVPT carline baru ke check sheet material di data sharing KAWI sesuai dengan aktivitas preparation yang ada dibulan berjalan dan disesuaikan dengan plan yang sudah dibuat	
4	FA	Issue data actual labour cost	Issue actual labour cost berdasarkan perhitungan dari Fin/Acc sebelum tanggal 6 setiap bulan	Max hari kerja ke 6
5	PP	Input ke format PP Cost Japan & JAI	Input data jam kerja total, kedatangan barang, stock control dan penggunaan actual material ke format PP Cost Japan dan JAI	
6	PP	Analisa perbedaan antara STP & RES	Melakukan analisa terhadap masing-masing carline mengacu pada prosesntase STP vs RES (Result)	
7	PP	Issue summary cost ke semua dept	Issue summary cost format JAI ke semua departemen	Max hari kerja ke 6
8	MTC,ENG, QA,NYS, PP,PROD	Dept review pencapaian STP vs RES	Masing masing departemen review pencapaian STP vs RES dan memberikan reason terhadap hasil pencapaian tersebut	
9	MTC,ENG, QA,NYS, PP,PROD	Review monthly report PP cost	Review monthly report PP cost bersama seluruh manajement	Max hari kerja ke 7
10	MTC,ENG, QA,NYS, PP,PROD	Hasil review ok ?	Jika hasil revie OK, lanjut ke no.11, jika tidak lanjut ke no.8	
11	PP	Issue report PP cost monthly ke FA	Issue report PP cost monthly format Japan ke FA	Setiap tgl 15 Tiap bulan

IV. INSTRUKSI PENGISIAN CHECK SHEET

Check Sheet Preparation Cost Control Actual Man Hour Dan Material

1	Section / Depat	:	Diisi dengan nama section / departemen
2	Family	:	Diisi dengan nama family, Contoh : Engine Room
3	Actual		
	Qty Man Power	:	Diisi jumlah manpower yang bekerja sesuai item yang telah ditentukan
	Work Hours	:	Diisi jam kerja manpower sesuai item yang telah ditentukan
	Total Material	:	Diisi jumlah harness baru yang digunakan sesuai item yang telah ditentukan

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen IATF 16949 ini dimulai dari nol	24 Jul 2019	QSA
01	Revisi pada flowchart dan penjelasannya (proses no.3) yaitu : Perubahan metode pengambilan data wear & tear	17 Jul 2023	PP
02	1. Revisi flowchart dan penjelasannya 2. Revisi pengisian check sheet preparation cost control actual man hour dan material	10 Jun 2024	PP
