
PPL-W-04

FOLLOW UP DELAY PRODUKSI

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		
DEDI KURNIAWAN P / PPC JMGR	EVANINGSIH M / PPC SSPV	AVIF PRIMA N / PPC SPV

Versi Indonesia

FOLLOW UP DELAY PRODUKSI

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN

WHAT Petunjuk pelaksanaan melakukan follow up apabila terjadi delay produksi yang bisa disebabkan karena :


1. Adanya defect produk
2. Karena adanya problem 4M (Man, Material, Metode, Mesin)
3. Hal lainnya yang dapat menyebabkan delay produksi.

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat terjadi delay produksi.

WHERE Instruksi ini diterapkan di PT JAI untuk semua produk.

WHO Penanggungjawab kegiatan ini adalah Departemen PPIC seksi PPC dan Departemen Produksi.

II. FLOWCHART

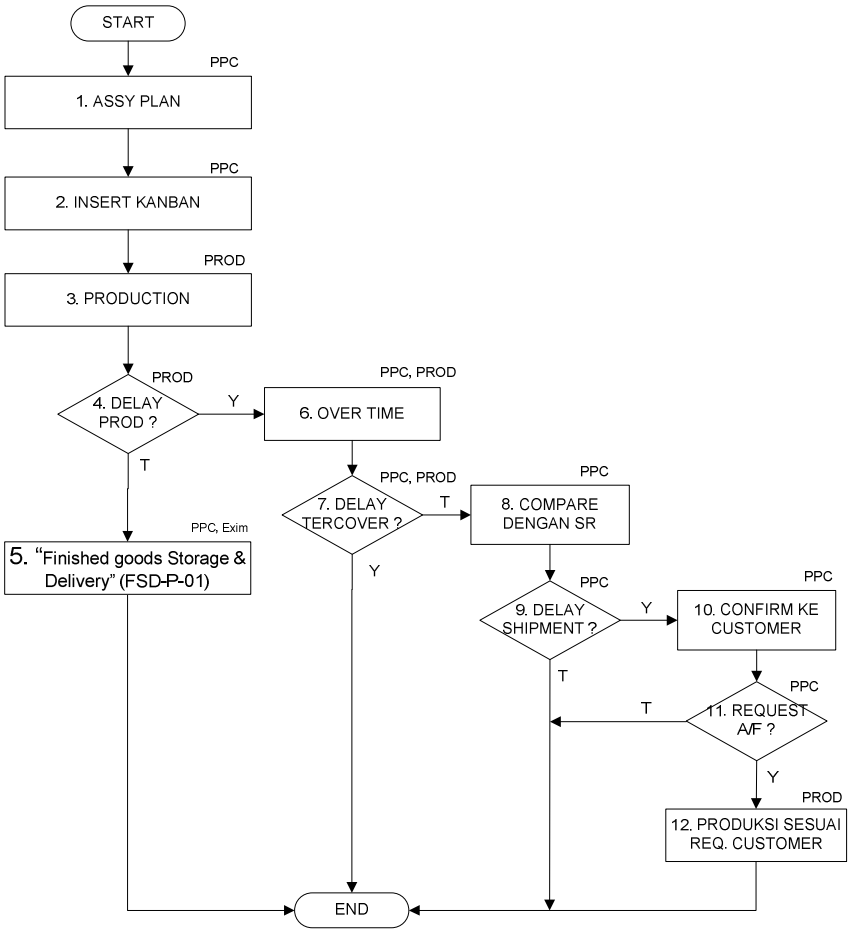

FOLLOW UP DELAY PRODUKSI

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PPC	Assy Plan	PPC issue assy plan yaitu rencana produksi selama 1 bulan ke produksi sebagai acuan untuk melakukan produksi selama 1 bulan
2	PPC	Insert kanban	PPC meng-issue sticker box (untuk shipment A/F)/polytainer & memasukkan instruction kanban keheijunka post sebagai perintah untuk memproduksi harness kepada departemen produksi
3	PROD	Production	Departemen produksi memproduksi harness dengan assy # dan jumlah sesuai dengan kanban yang sudah diinsert oleh PPC
4	PROD	Delay prod ?	Apakah produksi yang dilakukan sudah sesuai dengan kanban yang diinsert PPC, jika terjadi delay produksi maka lanjut ke no 6, jika tidak maka lanjut ke no 5
5	PPC, EXIM	Finished Goods Storage and Delivery Procedure	Jika tidak ada delay produksi, maka lanjutkan proses sesuai dengan prosedur "Finished Goods Storage and Delivery" (FSD-P-01)
6	PPC, PROD	Over time	Overtime dilakukan jika : - Delay produksi > 1 hari, maka produksi melakukan overtime. Tetapi sebelumnya produksi harus melakukan konfirmasi ke PPC terlebih dahulu - Ada request dari PPC untuk overtime karena adanya kondisi-kondisi tertentu. Over time dilakukan pada hari biasa, bila kurang dapat dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu
7	PPC, PROD	Delay tercover ?	Apakah delay produksi sudah tercover setelah dilakukan over time ? jika sudah maka proses selesai, jika belum maka lanjut ke no 8
8	PPC	Compare dengan SR	Compare delay yang tidak bisa tercover walaupun sudah dilakukan over time dengan SR, untuk mengetahui apakah delay produksi mempengaruhi shipment F/G atau tidak
9	PPC	Delay shipment ?	Apakah terjadi delay shipment atau tidak sebagai akibat delay produksi? Jika ya lanjut ke no 10, jika tidak maka proses selesai
10	PPC	Confirm ke customer	Informasikan delay shipment ke customer dan minta advise assy # mana saja yang harus didahulukan dikirim dan apakah membutuhkan Air Freight atau tidak
11	PPC	Request A/F ?	Apakah customer meminta A/F ? Jika ya lanjut ke no12, jika tidak maka proses selesai

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
12	PROD	Produksi sesui request customer	Memproduksi sesuai dengan permintaan A/F dari customer

IV. REFERENCES

- Prosedur Production Plan
- Prosedur Pembuatan Assy Plan

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	New Release	27 Feb 2006	QSA
01	- Delete flowchart item no 10 (Kalkulasi & revisi assy plan) - Revisi flowchart item no 12 yaitu Meeting menjadi Produksi sesuai request customer	09 Juli 2013	PPC
02	Revisi Approval	19 Aug 2025	QSA
