PQP-W-17

PRODUCTION PREPARATION COST CONTROL

APPROVED	CHECKED	PREPARED
TEGUH WICAKSONO / NYS MGR	TEGUH WICAKSONO / NYS MGR	AFIANTY MARDIANA / NYS SPV

Versi Indonesia

PRODUCTION PREPARATION COST CONTROL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Instruksi ini digunakan untuk mengontrol production preparation cost yang berhubungan dengan man, method, machine dan material dari semua departemen yang berhubungan dengan aktivitas expense production preparation

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat fase preparation hingga SOP mengacu pada prosedur Product Realization

WHERE Instruksi ini digunakan untuk semua carline project (new project, model change, model year, project transfer) di PT. JAI

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah departemen NYS, section PP yang disupport oleh departemen terkait

II. FLOW CHART PEMBUATAN REPORT PP COST MONTHLY

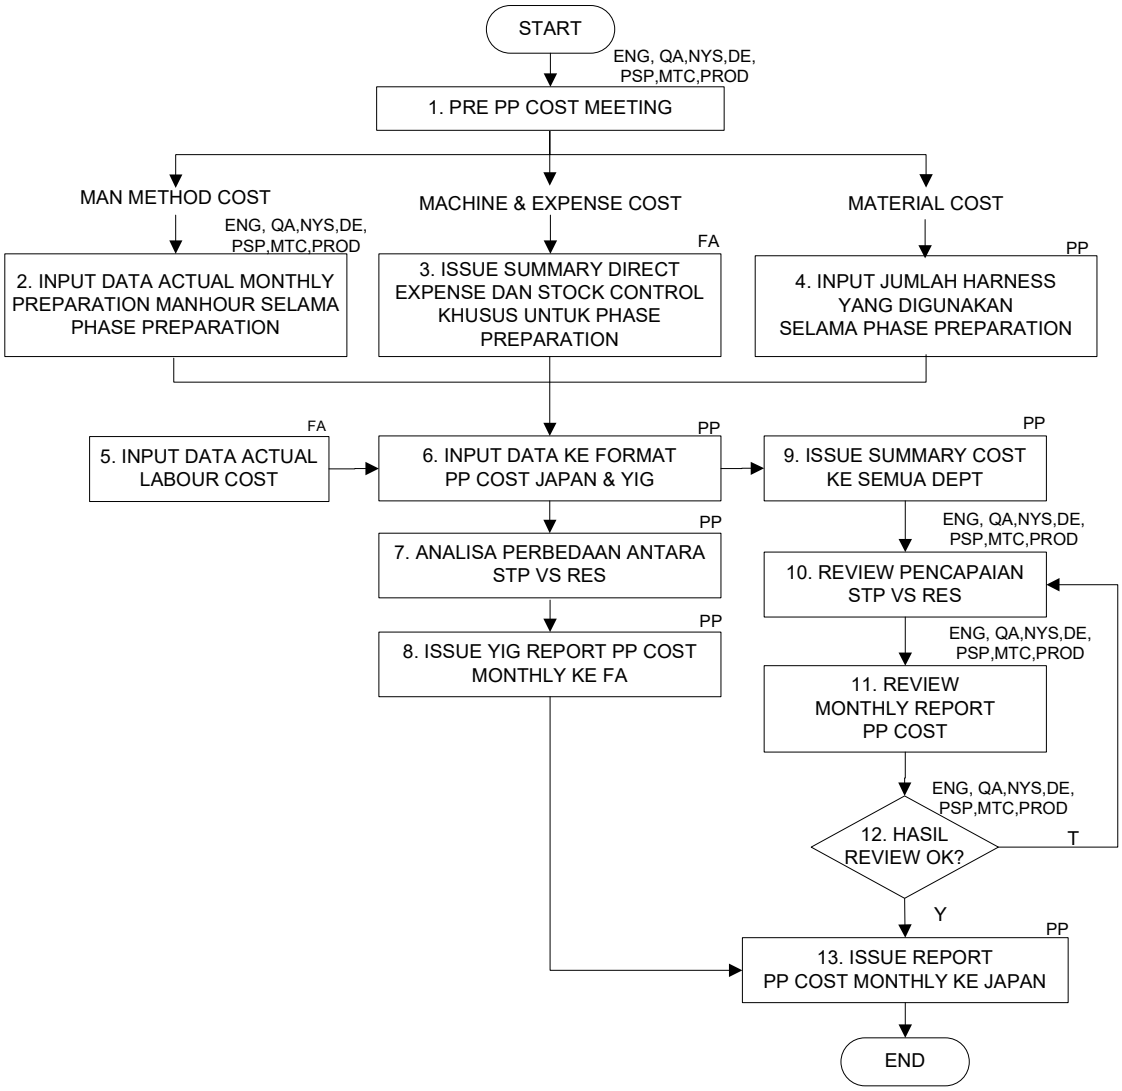

III. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
1	ENG, QA, NYS, DE, PSP, MTC, PROD	Pre PP Cost Meeting	Melakukan Pre PP Cost Meeting untuk melakukan koordinasi terkait PP Cost dari suatu project	
2	ENG, QA, NYS, DE, PSP, MTC, PROD	Input data actual monthly preparation manhour selama phase preparation	Melakukan input data monthly Manhour (MH = jam kerja x jumlah orang) ke program BULUS – Preparation manhour sesuai dengan aktivitas preparation yang ada dibulan berjalan dan disesuaikan dengan plan yang sudah dibuat	Max hari kerja ke 3
3	FA	Issue summary direct expense dan stock control khusus untuk phase preparation	Issue summary direct expense sesuai delivery timing dan quantity part sesuai stock control untuk part yang digunakan saat preparation	Max hari kerja ke 4
4	PP	Input jumlah harness yang digunakan selama phase preparation	Melakukan input jumlah harness yang digunakan untuk training maupun HVPT carline baru ke check sheet material di data material sesuai dengan aktivitas preparation yang ada dibulan berjalan dan disesuaikan dengan plan yang sudah dibuat	
5	FA	Input data actual labour cost	Input actual labour cost berdasarkan perhitungan dari Fin/Acc ke program BULUS – Preparation manhour	Max hari kerja ke 4
6	PP	Input ke format PP Cost Japan & YIG	Input data jam kerja total, kedatangan barang, stock control dan penggunaan actual material ke format PP Cost Japan dan YIG	
7	PP	Analisa perbedaan antara STP & RES	Melakukan analisa terhadap masing-masing carline mengacu pada prosentase STP vs RES (Result)	
8	PP	Issue YIG report PP Cost monthly ke FA	Issue report PP Cost monthly format YIG ke FA	Max hari kerja ke 5
9	PP	Issue summary cost ke semua dept	Issue summary cost format JAI ke semua departemen	Max hari kerja ke 5
10	ENG, QA, NYS, DE, PSP, MTC, PROD	Review pencapaian STP vs RES	Masing masing departemen review pencapaian STP vs RES dan memberikan reason terhadap hasil pencapaian tersebut	

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Timing
11	ENG, QA, NYS, DE, PSP, MTC, PROD	Review monthly report PP cost	Review monthly report PP cost bersama seluruh management	Max hari kerja ke 7
12	ENG, QA, NYS, DE, PSP, MTC, PROD	Hasil review ok ?	Jika hasil review OK, lanjut ke no.13, jika tidak lanjut ke no.10	
13	PP	Issue report PP cost monthly ke Japan	Issue report PP cost monthly format YC ke Japan	Setiap tgl 15 Tiap bulan

IV. INSTRUKSI PENGISIAN CHECK SHEET

Check Sheet Preparation Cost Control Actual Machine Dan Expense

1 Section / Depat : Diisi dengan nama section / departemen
2 Family : Diisi dengan nama family, Contoh : Engine Room
3 Template Preparation Cost Control Actual Man Hour
   1. Indirect Permanent : Diisi jumlah jam kerja manpower Indirect Permanent sesuai item yang telah ditentukan
   2. Indirect Contract : Diisi jumlah jam kerja manpower Inderect Contract sesuai item yang telah ditentukan
   3. PS Permanent : Diisi jumlah jam kerja manpower Production Support Permanent sesuai item yang telah ditentukan
   4. PS Contract : Diisi jumlah jam kerja manpower Production Support Contract sesuai item yang telah ditentukan

Note :
1. Dept. yang mengisi "Indirect Contract & Indirect Permanent" hanya Produksi & QA
2. Dept. yang mengisi "PS Permanent" adalah ENG, QA, NYS, PSP, MTC, DE
3. Dept. yang mengisi "PS Contract" adalah ENG, QA, NYS, PSP, MTC, DE

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen IATF 16949 ini dimulai dari nol	24 Jul 2019	QSA
01	Revisi pada flowchart dan penjelasannya (proses no.3) yaitu : Perubahan metode pengambilan data wear & tear	17 Jul 2023	PP
02	1. Revisi flowchart dan penjelasannya 2. Revisi pengisian check sheet preparation cost control actual man hour dan material	10 Jun 2024	PP
03	1. Revisi Bab I (Where : menambahkan project) 2. Revisi Bab II & III (Flowchart & Penjelasannya) : - Penambahan proses no1. & no. 8 - Revisi proses no. 2, 5 & 13 3. Revisi Bab IV (Instruksi Pengisian Checksheet) : - Revisi Judul checksheet & item-item pengisian	6 Mar 2026	PP
