PQP-W-18

CROSS FUNCTIONAL REVIEW

APPROVED	CHECKED	PREPARED
TEGUH WICAKSONO / NYS MGR	TEGUH WICAKSONO / NYS MGR	AFIANTY MARDIANA / NYS SPV

Versi Indonesia

CROSS FUNCTIONAL REVIEW

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan Cross Functional Review (CFR) baik berupa proses review maupun pembuatan dokumen penunjang

WHEN Instruksi ini digunakan mulai dari CFR4-a sampai CFR6-a untuk setiap produk baru / project baru

WHERE Instruksi ini berlaku di JAI untuk seluruh produk

WHO Penanggung jawab pelaksanaan CFR adalah project manager masing-masing project dan pelaksanaannya dikontrol oleh PP Departemen

II. DEFINISI

GPMS	:	Global Process Management System
BU	:	Bussiness Unit
Off Tools	:	Kelengkapan equipment produksi dan pengembangan system produksi untuk mencapai target QCDE
Off Process	:	Kelengkapan proses produksi dan kemampuan dalam mencapai target, termasuk approval produk


CROSS FUNCTIONAL REVIEW

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. SCHEDULE / TIMING CFR

GPMS Phase	Project Phase	Title	CFR	Tujuan	PIC	
					BU	JAI
CFR0-a sampai dengan CFR3-c dilakukan oleh BU						
Ph4	1A / TTO / Koushi / PT Lot	Proses persiapan SOP	CFR4-a (Off Tool)	Verifikasi kesiapan equipment dan jig board	O	O
	2A / PP / MPT / SEISI / QCV / FCV / PT2 LOT		CFR4b (Off Process)	Verifikasi kesiapan untuk melakukan mass-production (SOP)	O	O
Ph5	HVPT	Proses approval mass production	CFR5 (Approval SOP)	Memastikan pencapaian target project (QCDE) dan approval	O	O
Ph6	SOP	Refleksi Project	CFR6-a (Penghentian special initial control)	Verifikasi kondisi special initial control dapat diakhiri berdasarkan hasil SOP selama 3 bulan	O	O PP, Prod, QA
			CFR6-b (Dilakukan oleh BU)			

IV. FLOW CHART & SCHEDULE / TIMING CFR

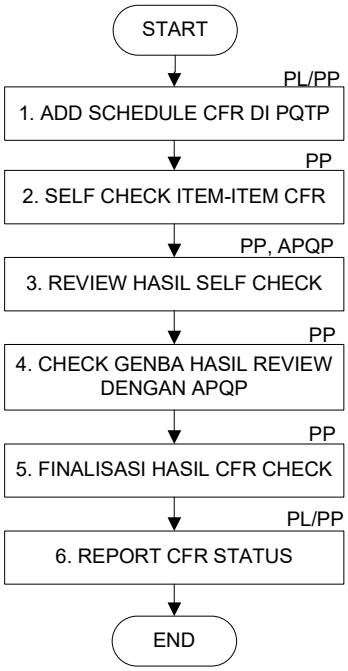

V. PENJELASAN FLOWCHART

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PL/PP	Add schedule CFR di PQTP	Add schedule / timing CFR di PQTP sesuai dengan timing / phase production preparation masing-masing project
2	PP	Self check item-item CFR	Check kondisi / status masing-masing item di checksheet CFR sesuai dengan timing production preparation. Self check dilakukan 1W sebelum produk pada phase tersebut dikirim ke Japan. Buat summary hasil self check
3	PP, APQP	Review hasil self check	Review summary hasil self check dengan member APQP Tentukan countermeasure, due date dan PIC untuk kondisi status item yang masih NG. Lakukan review summary maksimal 1W sebelum self check dilakukan.
4	PP	Check genba hasil review dengan APQP	Lakukan check genba terhadap countermeasure hasil self check sesuai dengan due date yang sudah ditentukan
5	PP	Finalisasi hasil CFR check	Update kesesuaian hasil check genba dengan finding untuk kondisi / item yang NG, Follow up untuk kondisi Red / Yellow paling lambat 1W sebelum report CFR status dikirim
6	PL/PP	Report CFR status	Buat report berupa CFR status dan informasi terkait kondisi Red ke BU

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen IATF 16949 ini dimulai dari nol	31 Juli 2019	QSA
01	- Revisi Bab I (When) yaitu CFR6-b diganti menjadi CFR6-a - Revisi Bab III (Schedule / Timing CFR) yaitu untuk CFR6-b dilakukan oleh BU	6 Mar 2026	PP
