PPL-W-02

PEMBUATAN SPP
(SIX MONTHS PRODUCTION PLAN)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
DEDI KURNIAWAN P / PPC JMGR	EVANINGSIH M / PPC SSPV	AVIF PRIMA N / PPC SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN SPP (SIX MONTHS PRODUCTION PLAN)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pembuatan SPP (Six Months Production Plan), yaitu rencana produksi untuk enam bulan ke depan.

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat pembuatan SPP yaitu setiap ada perubahan SR.

WHERE Instruksi ini diterapkan di PT JAI untuk semua produk.


WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen PPIC seksi PPC.

WHY Untuk menghitung rencana produksi sampai dengan enam bulan yang akan datang sesuai dengan order yang diterima dan merencanakan besarnya kapasitas yang akan digunakan sesuai dengan hal yang disebutkan diatas.

II. ISTILAH

1	SR	Shipping Release yaitu Purchase Order dari customer yang menyatakan assy number, jumlah dan waktu di butuhkan oleh customer
2	SPP	Six months Production Plan Rencana produksi untuk 6 bulan ke depan yang di buat berdasarkan order customer dan forecasting untuk kebutuhan perencanaan material, mesin, equipment, dll.
3	Assy Plan	Rencana produksi harian untuk jangka waktu 1 bulan yang menyatakan assy number dan jumlah produksi sebagai pedoman di area produksi untuk melakukan proses
4	SR Variance	Analisa variasi atau fluktuasi antara SR revisi terakhir dibandingkan dengan SR atau beberapa SR yang diterima sebelumnya
5	Schedule produksi	Kalendar produksi mingguan selama satu tahun
6	SST	Shipment Schedule Tracking Report yang berisikan tentang order dari customer, rencana produksi dan hasil pengiriman
7	Customer	Yazaki sales affiliate

III. FLOWCHART

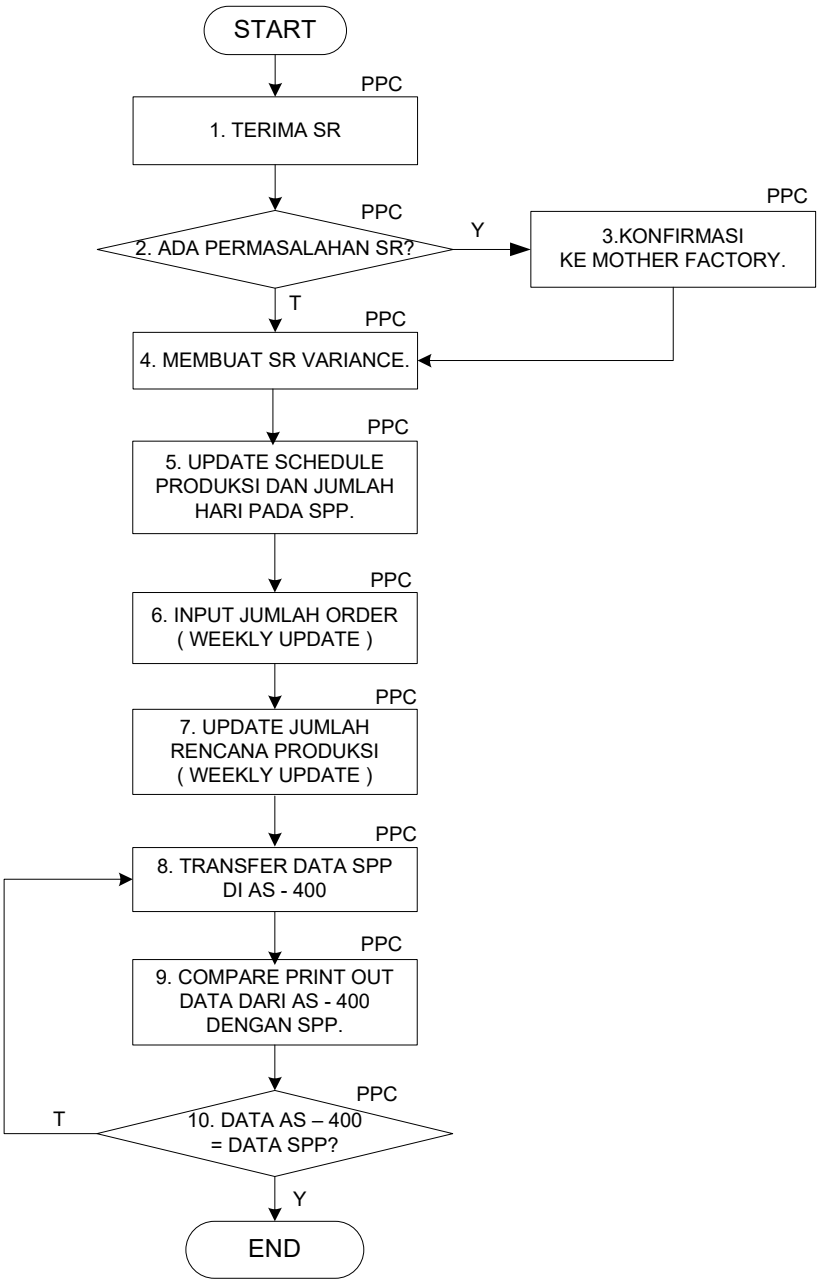

PEMBUATAN SPP
(SIX MONTHS PRODUCTION PLAN)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PPC	Terima SR	PPC menerima SR dari customer (Internal Yazaki / YNAN) yazaki sales affiliate setiap minggu
2	PPC	Ada permasalahan SR ?	PPC melakukan pengecekan, apabila ada permasalahan dengan SR maka lanjutkan ke no. 3, jika tidak ke no. 4
3	PPC	Konfirmasi ke Mother Factory	PPC melakukan konfirmasi ke Mother Factory karena adanya permasalahan SR ke Internal Yazaki / YNAN
4	PPC	Membuat SR variance	PPC membuat SR variance S/R baru terhadap S/R sebelumnya
5	PPC	Update schedule produksi dan jumlah hari pada SPP	PPC melakukan update schedule produksi dan jumlah hari pada SPP. Jika ada design change maka level, UMH, Assy code dan jumlah circuit juga harus dirubah
6	PPC	Input jumlah order (weekly update)	PPC melakukan input jumlah order setelah menerima shiping release tiap minggu
7	PPC	Update jumlah produksi (weekly update)	Mengupdate jumlah rencana produksi bulanan (untuk periode 6 bulan ke depan) dengan membandingkan stock yang tersedia (Balance) dengan jumlah order (Delivery) dalam bulan tersebut supaya tidak negatif. Update jumlah produksi bulanan dapat mempertimbangkan order dan jumlah hari pada bulan berikutnya. Jika pada bulan depan order tinggi dan jumlah hari sedikit, maka loading dapat ditarik maju pada bulan sebelumnya sehingga balance akhir pada bulan sebelumnya positif. Note : harus konfirmasi terlebih dahulu dengan customer
8	PPC	Transfer data SPP di AS-400	SPP diprint out dan selanjutnya ditransfer ke sistem AS-400.
9	PPC	Compare print out data dari AS-400 dengan SPP	Hasil dari transfer data pada AS-400 (OES) tadi diprint untuk dicek apakah jumlah perbulannya sama dengan yang ada di SPP.
10	PPC	Apakah data AS-400 = SPP?	Jika ya maka proses berakhir, jika tidak maka kembali ke no. 8

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	The revision number of this ISO/TS 16949 document is started from zero	19 Feb 2004	QSA
04	Revisi flowchart untuk proses no.12 (input data SPP=> Transfer data)	18 Okt 2021	PPC
05	- Revisi flowchart & penjelasan 1. no.3 (Konfirmasi ke customer diganti menjadi konfirmasi ke Mother Factory) 2. Delete proses no.5-8 (perbedaan SR> 20%?, Stock Material cukup? , A/F authorization, Order material)	19 Aug 2025	PPC
